


1. Do czasu związania betonu w zamkach, pozostawić podpory montażowe.
2. Na każdym etapie montażu zapewnić stateczność ścian.
3. Luz montażowy ścian wynosi 10 mm.
4. Podlewka betonowa pod prefabrykatami gr. min. 20mm.
5. Projekt warsztatowy rozpatrywać razem z projektem konstrukcji.
6. Ostateczną decyzję o kolejności montażu elementów ustala kierownik montażu/robót.
7. W elementach nr: 102, wyciąć progi po montażu.

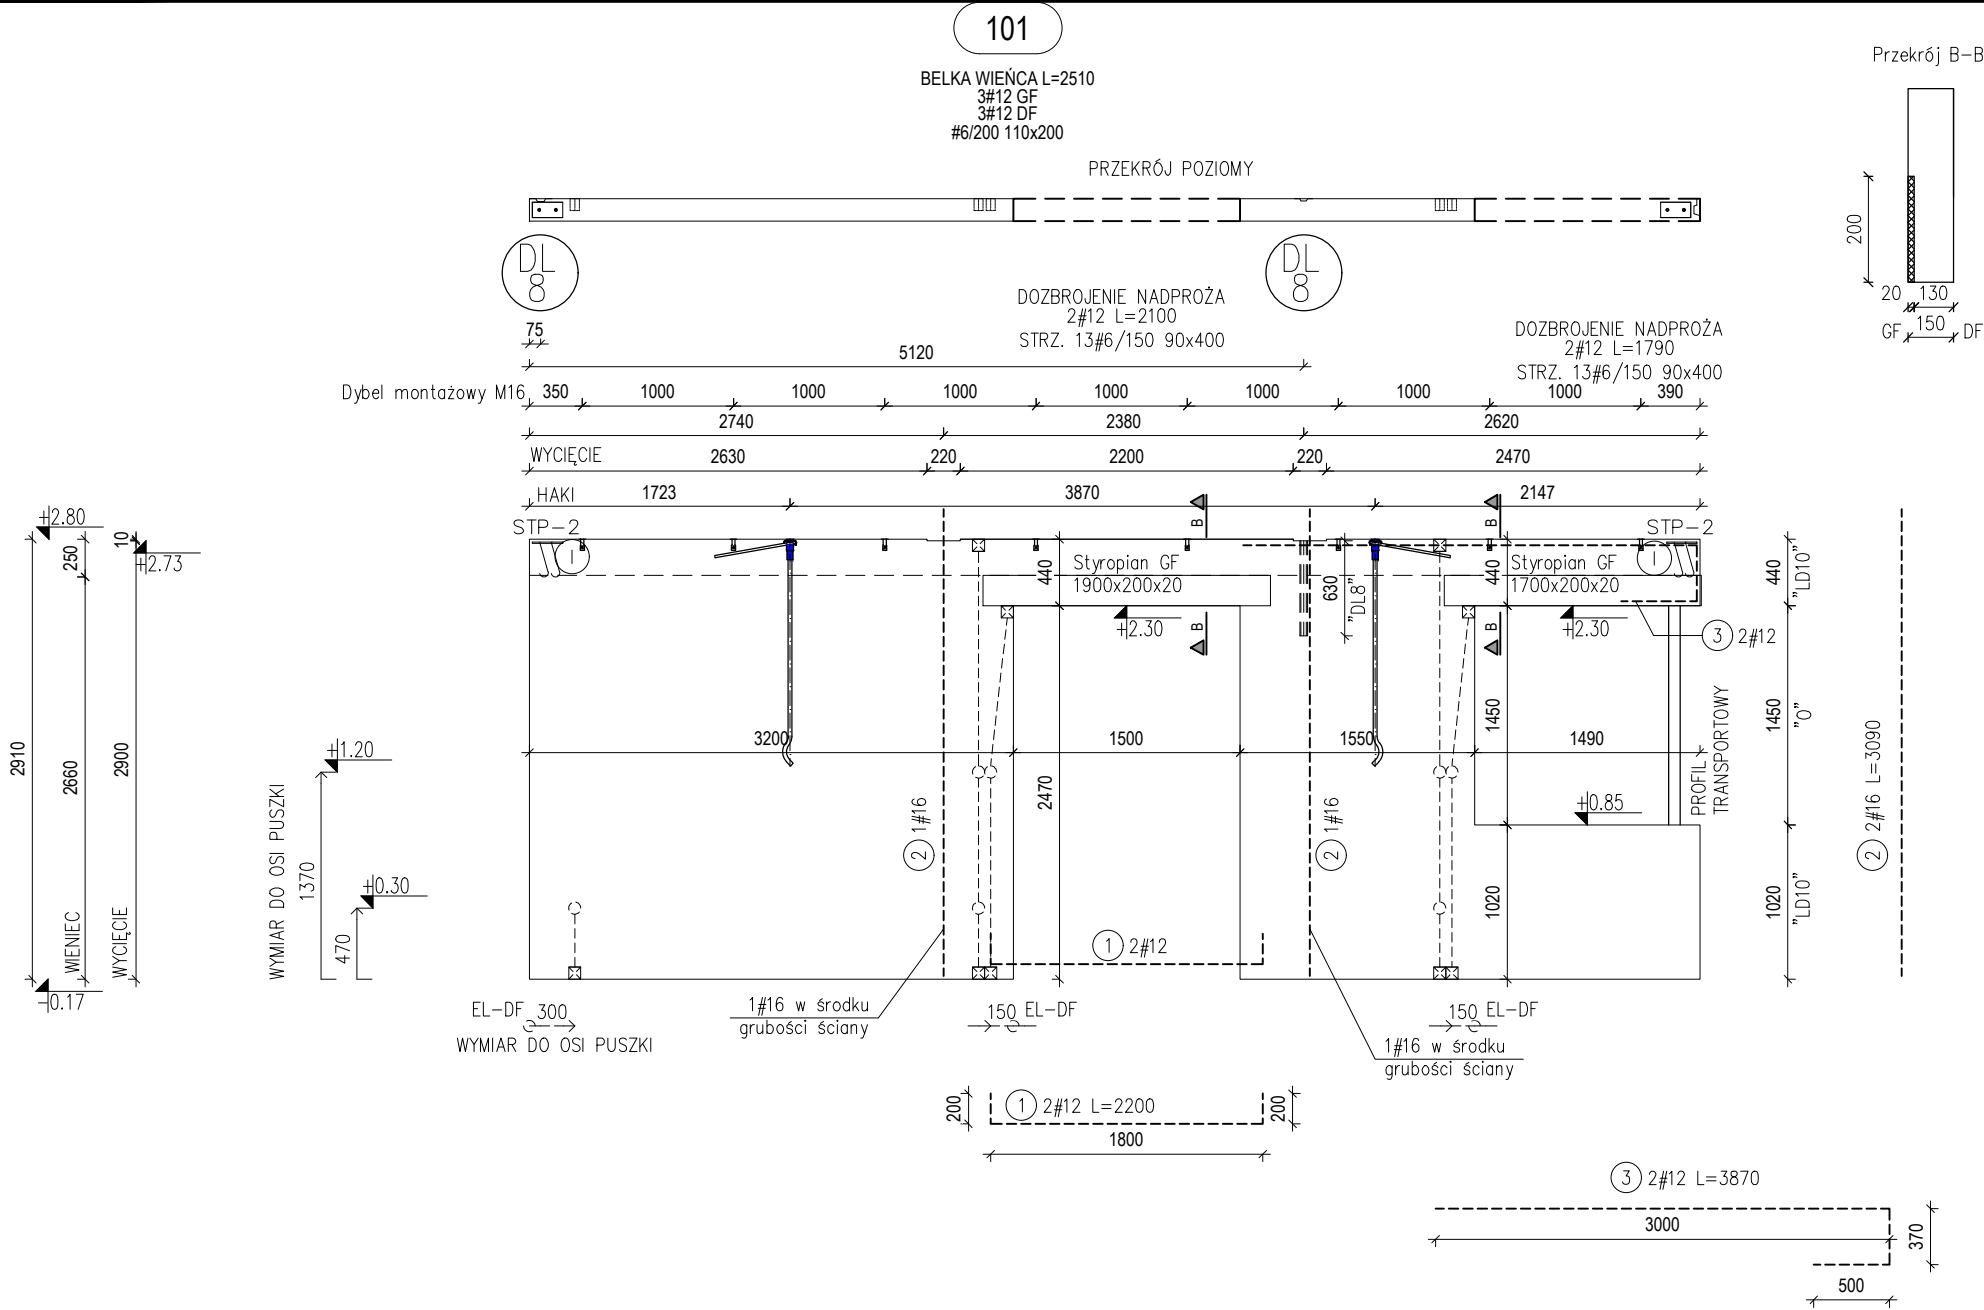


DŁUGOŚĆ	7740
KRAWĘDŹ	0
ZAMEK	LD10
PUSZKI ELEK.	7 SZT.
OBJĘTOŚĆ	2,5 M3
CIEŻAR	5,0 T
HAKI MONT.	RD 36 D

STP2 MARKA STAŁOWA 100X200X8 +2Ø8 I -DODATKOWO 3Y6 I* -DODATKOWO 2Y6
ZAGŁĘBIONA 20 MM

HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIAĆ
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM

W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE
ZAMEK:6 STRZEMIONA #6 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. :	TOPOROWICE
TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON :	LC16/18/D=2,0
STAL :	Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.
ZBROJENIE :	SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.
GRUBOŚĆ:150 MM.	WYS.: 2910 MM

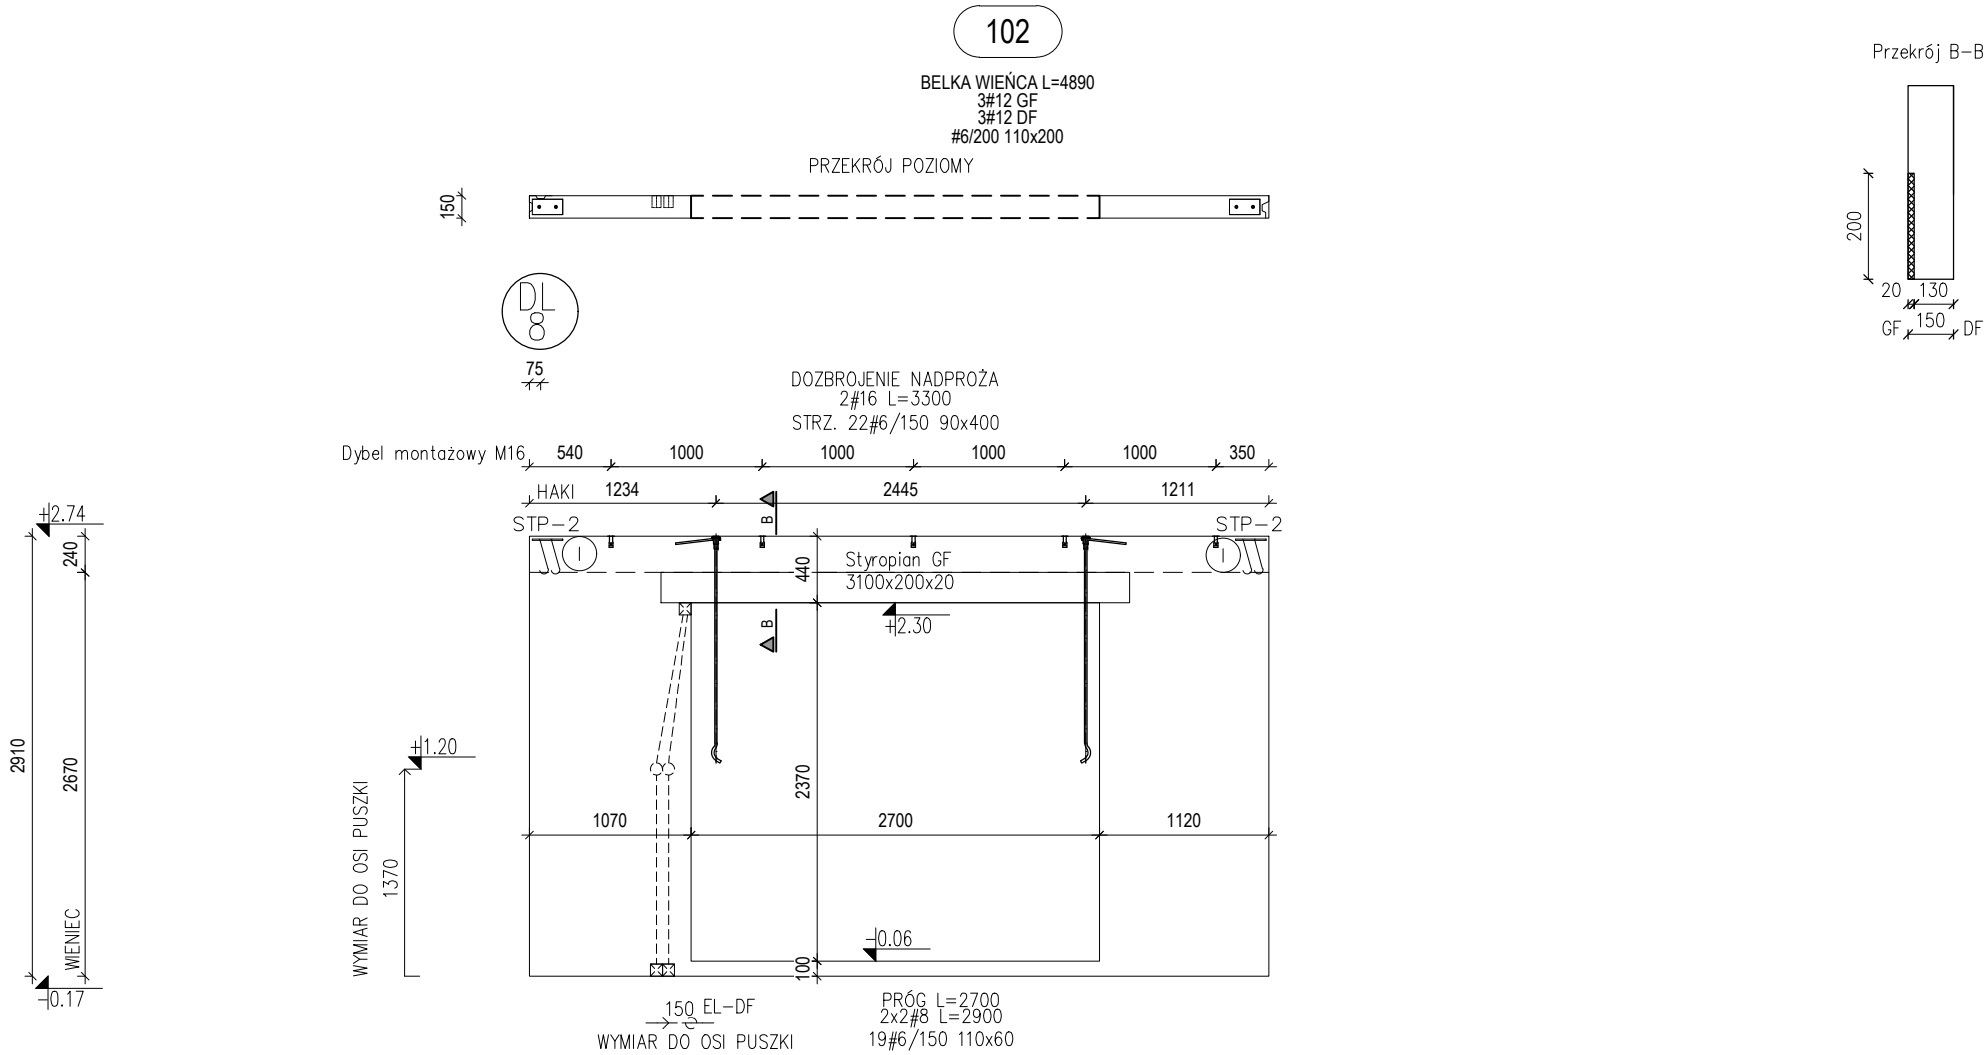


DŁUGOŚĆ	4890	
KRAWĘDŹ		
ZAMEK	L10	LG10
PUSZKI ELEK.	2 SZT.	
OBJĘTOŚĆ	1,2 M3	
CIEŻAR	2,4 T	
HAKI MONT.	RD 24 D	

STP2 MARKA STAŁOWA 100X200X8 +2Ø8 I -DODATKOWO 3Y6 I* -DODATKOWO 2Y6
ZAGŁĘBIONA 20 MM

PRÓG USUNĄĆ NA BUDOWIE
HAK TRANSPORTOWY NAD OTWORAMI ŚCIAN / NADPROŻAMI NALEŻY ZAGIĄĆ
PUSZKA ELEKT. KAISER, RURKA Ø 25 MM

W KAŻDYM OTWORZE I BRUŹDZIE ZBROJENIE STANDARDOWE
ZAMEK:6 STRZEMIONA #6 MAX CO 600 MM NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ŚCIANY
ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : TOPOROWICE	
TYP: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1XSZLIFOWANA	
BETON : LC16/18/D=2,0	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : SIATKA Q131 W ŚRODKU GR.	
GRUBOŚĆ:150 MM.	WYS.: 2910 MM

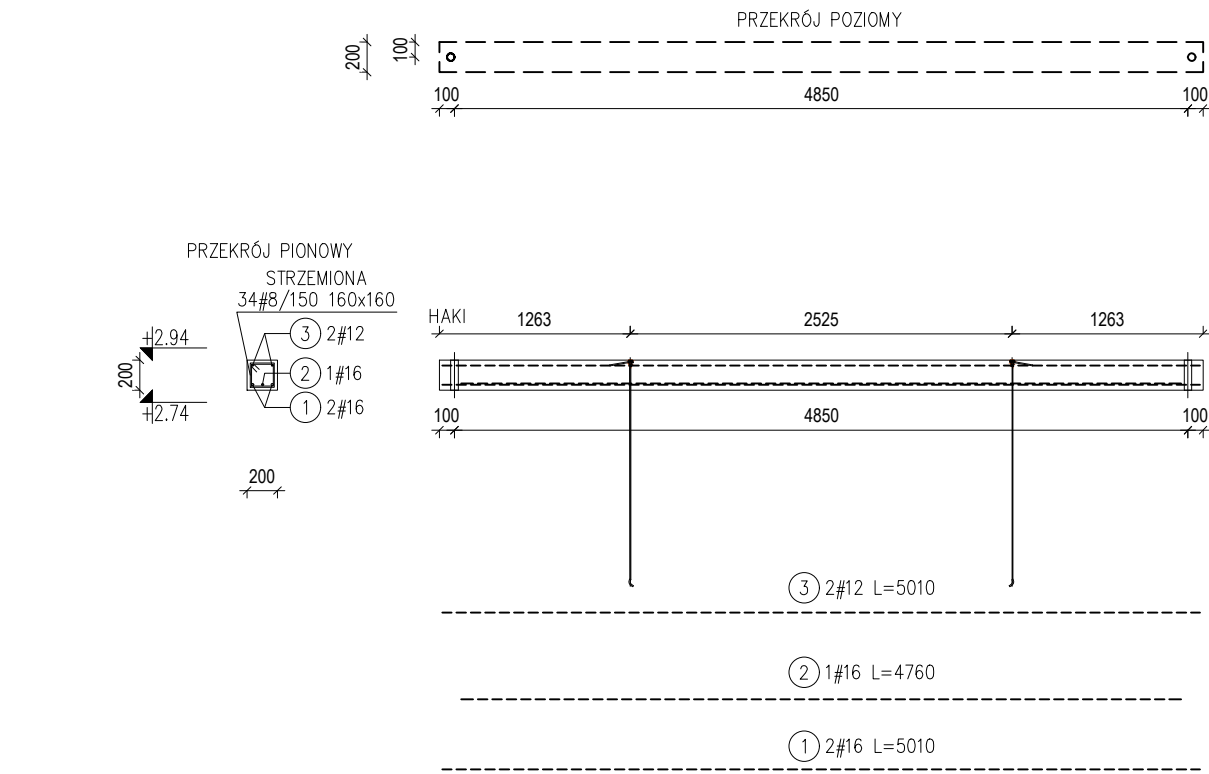


DŁUGOŚĆ	5050
KRAWĘDŹ	00
ZAMEK	
PUSZKI ELEK.	0 SZT.
OBJĘTOŚĆ	0,2 M3
CIEŻAR	0,5 T
HAKI MONT.	RD 12 D

—RURA KARB. FI50mm L=200mm W ŚRODKU
GRUBOŚCI W ROZSTAWIE JAK NA RYS.

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : TOPOROWICE	
TYP: BELKA WEWNĘTRZNA 2XSZLIFOWANA	
BETON :C30/37	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : WG RYSUNKU	
GRUBOŚĆ:200 MM.	WYS.: 200 MM

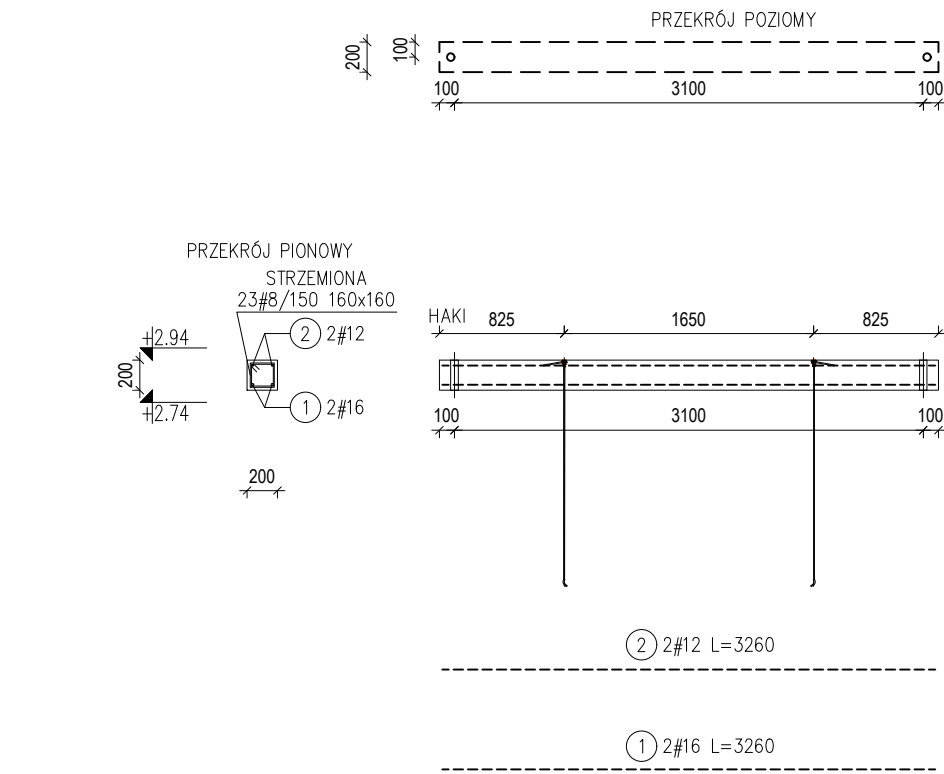

DŁUGOŚĆ	3300
KRAWĘDŹ	00
ZAMEK	
PUSZKI ELEK.	0 SZT.
OBJĘTOŚĆ	0,1 M3
CIEŻAR	0,25 T
HAKI MONT.	RD 12 D

—RURA KARB. FI50mm L=200mm W ŚRODKU
GRUBOŚCI W ROZSTAWIE JAK NA RYS.

ELEMENTY W KOLORZE SZARYM

BUD. : TOPOROWICE	
TYP: BELKA WEWNĘTRZNA 2XSZLIFOWANA	
BETON :C30/37	
STAL : Bst 500 M/S - otulina c=20 MM.	
ZBROJENIE : WG RYSUNKU	
GRUBOŚĆ:200 MM.	WYS.: 200 MM
